

No	1	分 類	ヒヤリハット	工 種	一般除雪	機械名	除雪トラック
内 容	<p>・除雪トラックにて一般除雪中、スノープラウで雪を歩道の2次堆雪帯へ処理する際に、物陰で死角になっていた歩行者を発見、投雪の塊で怪我をさせそうになった。</p>						
対 策	<p>・除雪トラックの乗務員による前方確認を確実に行う。 ・上記の恐れがある時は除雪機械の走行速度をおとし、無理に歩道内へ雪を飛ばさない。 ・路肩に堆雪が残った場合は、ロータリ除雪車による拡幅除雪等で早めに対応する。</p>						
写 真							

No	2	分 類	ヒヤリハット	工 種	一般除雪	機械名	除雪グレーダ
内 容	<p>・除雪グレーダにて一般除雪中、ブレードがハンドホールに接触し、鉄蓋が外れ、車道に落下した。 ・鉄蓋が一般車両に直接激突する恐れがあった。</p>						
対 策	<p>・シーズン前の路面確認では問題ないと思われていた。実際、シーズン中に3箇所と同様の事例が発生した。 ・危険と思われる箇所については、LED発光式の目印を設置する。 ・更に、路面点検を強化し標示箇所を増やして対応する。</p>						
写 真							

No	3	分類	ヒヤリハット	工種	一般除雪	機械名	除雪グレーダ
----	---	----	--------	----	------	-----	--------

内容
 ・緩やかなカーブ道にさしかかったところ、対向車がスピードを出して接近。除雪グレーダは5～10km/hで作業中に行っており、対向車が急ブレーキをかけ、衝突しそうになった。

対策
 ・無理のない走行の実施
 ・事前予知能力の向上訓練
 ・安全確認運転の定着指導

写真



No	4	分類	ヒヤリハット	工種	一般除雪	機械名	除雪グレーダ
----	---	----	--------	----	------	-----	--------

内容
 ・車道除雪中に、後方の一般車両が急に追い越してきて、排土板に衝突しそうになった。

対策
 ・後方に車両を確認したら一旦停止し、一般車両をやり過ごすか助手に誘導させ、衝突防止に努める。
 ・後方より一般車が近づいてきた場合、状況に応じて追い越しやすい場所があれば除雪車を停止させ、追い越させた後に作業開始する。

写真



No	5	分 類	ヒヤリハット	工 種	始業・終業	機械名	除雪グレーダ
----	---	-----	--------	-----	-------	-----	--------

内 容 ・除雪グレーダから降りるときに、完全に上がっていないサイドシャッターに足をかけたところ、サイドシャッターの油圧が抜けて落ちそうになった。

対 策 ・作業を終了し車庫に格納するときは、サイドシャッターは完全に上まであげる。
・車庫が狭いので、乗降車時には十分に注意する。

写 真



No	6	分 類	ヒヤリハット	工 種	拡幅除雪	機械名	ロータリ除雪車
----	---	-----	--------	-----	------	-----	---------

内 容 ・前方の降雪に埋まった駐車車両の発見が遅れ、除雪車に巻き込みそうになった。

対 策 ・早朝除雪車と連絡をし、道路状況を確認する。
・直ちに警察に連絡し、車両の持ち主を確認し直ちに移動をする。

写 真



No	7	分類	ヒヤリハット	工種	拡幅除雪	機械名	ロータリ除雪車
----	---	----	--------	----	------	-----	---------

内容 ・除雪作業中、左側に民家があるため反対側投雪の際、一般車両が通行した。

対策 ・シュート操作は、一般車に充分注意する。
 ・車両通行時には、プロワを停止しない。
 ・対向車線へのはみ出しに注意する。

写真




No	8	分類	ヒヤリハット	工種	拡幅除雪	機械名	ロータリ除雪車
----	---	----	--------	----	------	-----	---------

内容 ・除雪ドーザにより新雪除雪された雪をロータリ除雪車で拡幅除雪する際、市道から国道に出ようとした歩行者を発見し、急停車させ事無きを得た。タイミングがほんの少しずれていたら、ロータリ除雪車の運転席及び助手席の視界に入らず、大変な事態になっていた。

対策 ・雪壁が1m位になったら、交差点付近の雪壁撤去作業を行う。
 ・除雪ドーザで新雪除雪する際、視界の悪い交差点付近に雪を置かない。(視界の悪い交差点付近で、ロータリ除雪車が作業しなくてもいいように、雪の置き場に注意する)
 ・住民への危険ポイントへの事前周知。

写真

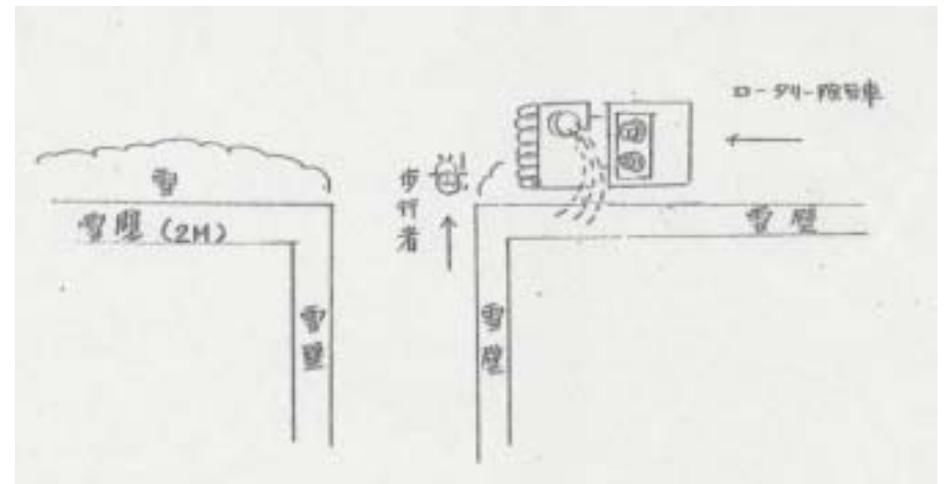

No	9	分類	ヒヤリハット	工種	運搬排雪	機械名	ロータリ除雪車
内容	<p>・運搬排雪時、出力を絞ってもダンプトラックから雪がこぼれ、一般車両に当たりそうになった。</p>						
対策	<p>・オペレータの技能向上。 ・的確な交通誘導。 ・ダンプトラックのあおりを立てる。</p>						
写真							

No	10	分類	ヒヤリハット	工種	一般除雪	機械名	除雪ドーザ
内容	<p>・幅員確保のため広く除雪しようとしたところ、積雪で側溝が確認できず、脱輪しそうになった。</p>						
対策	<p>・積雪前に、除雪路線の危険箇所の徹底確認をする。 ・作業前に、側溝のある場所がわかるよう目印をつくる。</p>						
写真	 						

No	11	分 類	ヒヤリハット	工 種	一般除雪	機械名	除雪ドーザ
----	----	-----	--------	-----	------	-----	-------

内 容 ・マンホール周辺の舗装沈下により、飛び出たマンホールにバケット及びブレードが引っかかり、機械が急停止してハンドル等に体をぶつけた。

対 策 ・マンホール周辺の路面補修。
・マンホール通過時には徐行する。

写 真



No	12	分 類	ヒヤリハット	工 種	一般除雪	機械名	除雪ドーザ
----	----	-----	--------	-----	------	-----	-------

内 容 ・圧雪除去作業中、道路に隣接している駐車場に止めてある車に、雪塊がぶつかりそうになった。

対 策 ・大きな雪塊にしないように、こまめに雪を搬出する。

写 真



No	13	分類	ヒヤリハット	工種	一般除雪	機械名	除雪ドーザ
----	----	----	--------	----	------	-----	-------

内容 ・後退の際、後方の軽トラックの確認が遅れ、衝突しそうになった。

対策 ・住宅や団地内の除雪でバックする時は、十分な後方確認を行う。
 ・助手は、除雪ドーザから降りて、一般車両の交通誘導を行い、作業の安全を確保する。

写真



No	14	分類	ヒヤリハット	工種	一般除雪	機械名	除雪ドーザ
----	----	----	--------	----	------	-----	-------

内容 ・道路除雪を実施中、後退の際、すぐ後方に車を発見した。
 ・道幅が狭く、除雪車すれすれに車が通ったため、ブレーキを踏んだ。

対策 ・助手が後方の車を誘導する。

写真



No	15	分 類	ヒヤリハット	工 種	新雪除雪	機械名	除雪ドーザ
----	----	-----	--------	-----	------	-----	-------

内 容 ・除雪作業中に、後方から一般車両が追い越してきて、もう少しでプラウと接触しそうになった。

対 策 ・後方の車両にも注意し、追い越しをかけてきたら停車し、やり過ごす。
・特に助手は、後方の確認を確実にを行う。

写 真




No	16	分 類	ヒヤリハット	工 種	一般除雪	機械名	除雪ドーザ
----	----	-----	--------	-----	------	-----	-------

内 容 ・人家連たん部の除雪作業時、誘導員を配置していたにもかかわらず、作業範囲内に歩行者を発見した。
・危険を感じたので作業を中止し、歩行者を安全な場所に誘導し作業を開始した。

対 策 ・作業開始前に作業範囲周辺の状況を確認し、作業を開始する。
・作業区間の起点、終点に誘導員を配置し、さらに中間にも誘導員を配置し、おもに歩行者の誘導を行う。
・オペレーターは歩行者等が発見した場合、作業を中止し誘導員と連絡を取り安全を確認した後に作業を開始する。

写 真

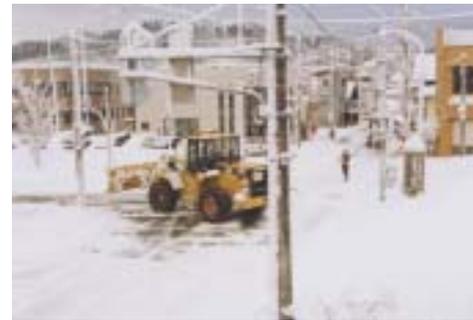

No	17	分 類	ヒヤリハット	工 種	歩道除雪	機械名	小形除雪車
----	----	-----	--------	-----	------	-----	-------

内 容
 ・地下横断歩道ボックスとバス停留所が隣接する歩道除雪箇所である。
 ・雪堤も高くなり、堆雪場所がなくなりつつある。
 ・投雪レバーのミス操作により投雪した雪が窓ガラスに直撃しそうになった。

対 策
 ・除雪車の速度を落とし投雪操作を慎重に行う。
 ・今後降雪があるようであれば、直ちに運搬排雪を行う。

写 真



No	18	分 類	ヒヤリハット	工 種	雪庇処理	機械名	高所作業車
----	----	-----	--------	-----	------	-----	-------

内 容
 ・橋梁の雪庇落とし中、高所作業車から落ちそうになった。
 ・橋梁の雪庇落とし中、雪が走行車両に当たりそうになった。

対 策
 ・作業員は安全帯を着用し、転落防止に努める。
 ・誘導員を配置し、作業員との連絡をとるようにした。

写 真

